

Institut Provençana

Pràctica

Gestió de Projectes

MÒDUL 1:

ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT


Unitat Formativa 1:

Desenvolupament de Programari

Eina Coma Bages



1 Planificació Gantt del projecte

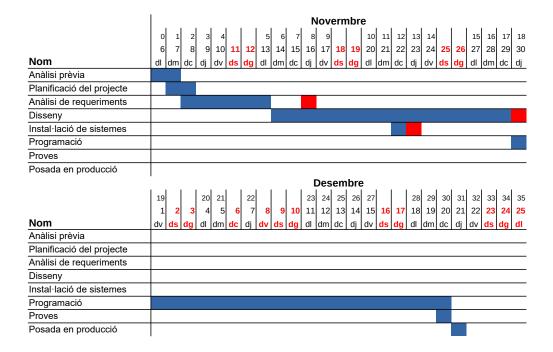

En blau les dates en que es treballa en cada tasca, i en vermell les dates de venciment.



2 Cost

Concepte	Hores	Р	reu hora	Extres	Pr	eu extra	Total
Anàlisi prèvia							
Director projecte		8	55.00 (3		65.00 €	440.00 €
Analista	3	32	48.00 €	<u> </u>		60.00€	1,536.00€
Subtotal							1,976.00 €
Planificació del projecte							
Director projecte	-	16	55.00 (<u> </u>		65.00 €	880.00€
Subtotal							880.00€
Anàlisi de requeriments							
Director projecte		16	55.00 (€		65.00 €	880.00€
Analista	(64	48.00 €	€		60.00€	3,192.00 €
Subtotal							4,072.00 €
Disseny							
Director projecte	2	20	55.00 €	9		65.00 €	•
Analista	18	30	48.00 €	€		60.00€	8,640.00 €
Subtotal							9,740.00 €
Instal·lació de sistemes							
Director projecte		2	55.00 €	€		65.00 €	110.00€
Tècnic de sistemes	-	16	42.00 €	0	2	50.00 €	772.00 €
Subtotal							882.00 €
Programació							
Director projecte	10	00	55.00 €	E		65.00 €	5,500.00€
Analista	20	00	48.00 €			60.00 €	9,600.00 €
Programador	70	00	40.00 €			50.00 €	•
Subtotal							43,100.00 €
Proves							
Director projecte		4	55.00 €			65.00 €	220.00 €
Analista		8	48.00 €			60.00 €	384.00 €
Programador	2	28	40.00 €	Ē		50.00 €	,
Subtotal							1,724.00 €
Posada en producció							
Director projecte		.8	55.00 €			65.00 €	
Programador		.6	40.00 €			50.00 €	
Tècnic de sistemes	5	.6	42.00 €	Ē		50.00 €	
Subtotal							343.20 €
Total							62,717.20 €



3 RAONAMENT

Amb jornades de 8 hores en dies laborables n'hi ha prou per poder completar totes les tasques abans de les dates límit excepte la instal·lació de sistemes.

El gruix de la tasca la duen a terme els tècnics de sistemes, que només tenim disponibles el dia abans del termini. Afortunadament, en tenim dos i han de fer 9 hores de feina cada un, per tant si cada un fa una hora extra podem completar la taca abans no venci.
